



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER

Plan for uke 14

Torsdag i forrige uke hadde vi vår første gulvstøp på bygget. Vi planlegger ny støp denne uka, og begynner å klargjøre for at vi etter påske skal montere plattendecker over plan 1 i deler av langtidsavdelingen.


I korttidsavdelingen pågår støp av siste fundamenter og søyler, og tilfylling rundt disse pågår for fullt.

Utenfor selve byggetomta jobber grunnentreprenør med VA – anlegget, og vi antar at i løpet av april er jobben utenfor byggeplassen så godt som ferdig, og vi kan igjen trekke oss tilbake til byggeplassen vår igjen.

Vi er pr i dag ca 25-27 fagarbeidere på byggeplassen. 18 betongarbeidere, 2 rørleggere, 5 fra grunnentreprenør og 2 som legger radonduk. Til tross for at det er spesielle tider, så går produksjonen godt, og det er god stemning.

Fokuset vårt er på å holde produksjonen i gang, og at vi alle skal holde oss friske.

Oversiktsbildet under er tatt med hjelp av drone, og er fra 26.03.20.
(Fotograf: Roger Eggen, Veidekke)

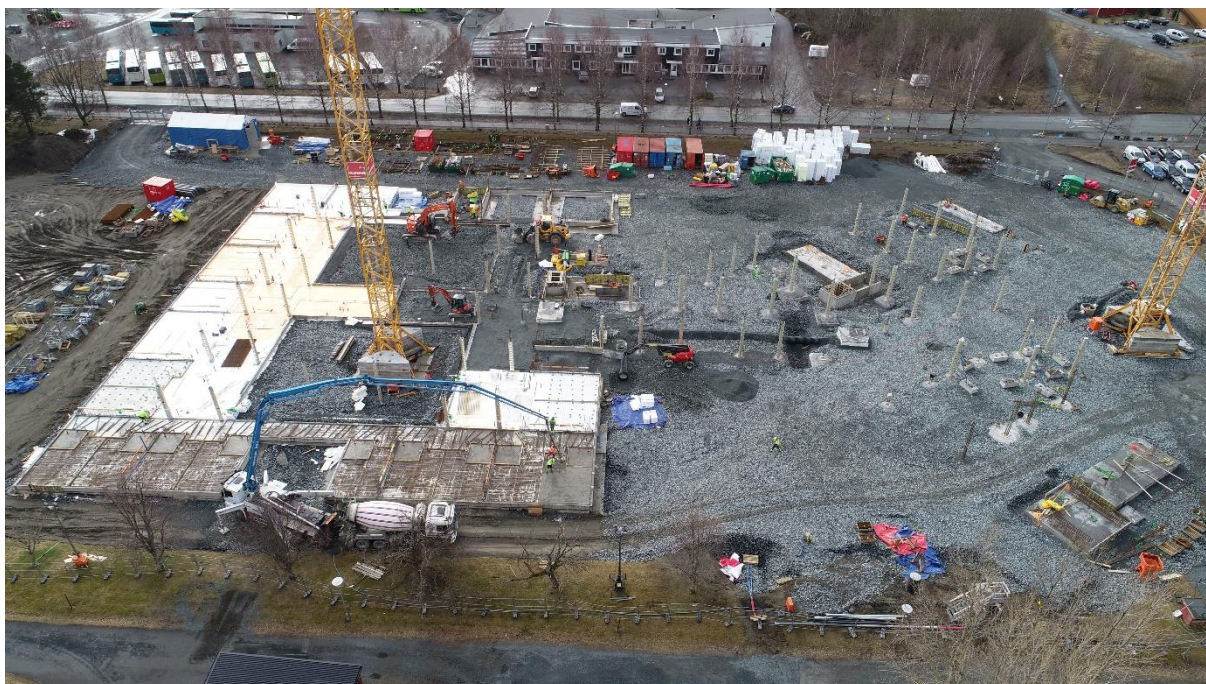

30.03.20 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS
