



VERDAL BO – OG BEHANDLINGSSENTER


Plan for uke 46

Denne uka begynner ATEA montasjen av TV – skjermer på bygget. Hvert beboerrom blir utstyrt med egen TV – skjerm montert på veggen over TV – benken. I tillegg skal det monteres skjermer i stuer og møterom. Denne leveransen er en byggherreleveranse, og her inngår det også høyttaleranlegg og annet AV – utstyr til bygget.

Andre hovedoppgaver denne uka vil være å lukke befaringspunkter etter ferdigbefaringer, og det står fortsatt igjen noe finisharbeid i hovedtrappa, samt annet småfikk her og der. Vinduene vaskes utvendig fra i dag av, og inne i varmen fortsetter byggvasken i fellesarealene og produksjonskjøkkenet.

Vi har flere uker skrevet om spileveggen som skal danne et skille mellom kafe/kantine og korridor i fellesareal. Nå er den montert, og dagens bilder viser denne veggen i ulike vinkler.

Fra å være godt over 100 håndverkere på topp, er det nå bare 15-20 personer som jobber i bygget. Stemningen er rolig, og vi går etter hvert inn for landing. Planen er at bygget overleveres til Verdal kommune 01.12.21. Framdrifta dit er under kontroll.

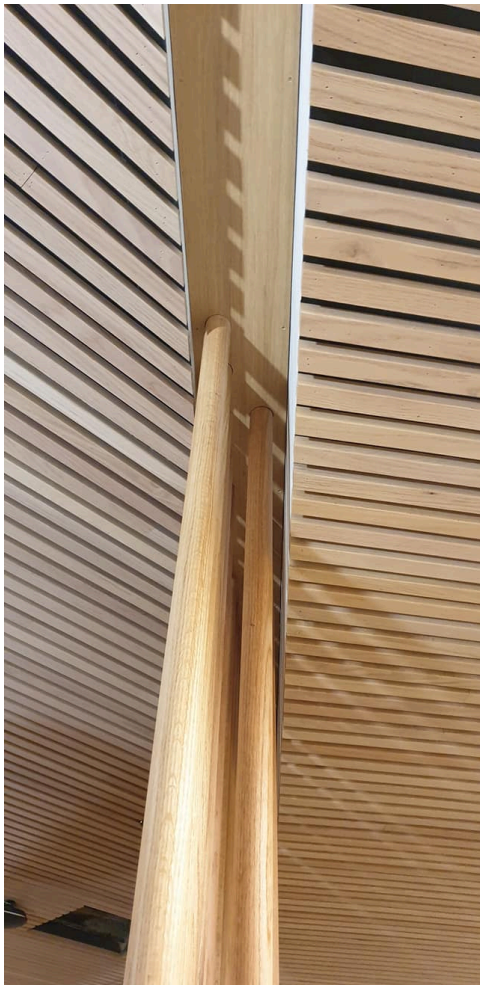

15.11.21 Trine Hynne, Grande Entreprenør AS / Veidekke AS
